

Harmonogram stavby "Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady"

Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania
Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady	23.08.2018	22.01.2019	153,00
Neoprávnené výdavky	13.09.2018	23.11.2018	72,00
ZT01 - zdravotechnika	13.09.2018	23.11.2018	72,00
Izolácie tepelné	23.09.2018	25.09.2018	3,00
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	23.09.2018	25.09.2018	3,00
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	20.09.2018	25.09.2018	6,00
Zdravotechnika	13.09.2018	07.10.2018	25,00
Potrubie z 3-vrstvových rúrok D50-	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Požiarne príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navyjákom	20.09.2018	02.10.2018	13,00
Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	02.10.2018	07.10.2018	6,00
Zdravotechnika	13.09.2018	23.11.2018	72,00
Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	08.11.2018	23.11.2018	16,00
Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach.	08.11.2018	23.11.2018	16,00
Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže	08.11.2018	23.11.2018	16,00
Demontáž drezov dvojitých bez výtokových armatúr	13.09.2018	18.09.2018	6,00
Montáž drezov jednoduchých bez výtokových armatúr	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	15.11.2018	22.11.2018	8,00
Oprávnené výdavky	23.08.2018	23.11.2018	93,00
SCMS01 - prestavba a prístavba MŠ - stavebná časť	23.08.2018	23.11.2018	93,00
Zemné práce	23.08.2018	04.09.2018	13,00
Odstránenie ornice s vodor. premiestn.	23.08.2018	28.08.2018	6,00
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	23.08.2018	28.08.2018	6,00
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	23.08.2018	28.08.2018	6,00
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	30.08.2018	04.09.2018	6,00
Zakladanie	10.09.2018	22.09.2018	13,00
Murivo základ PREMAC 50x25x25 bet výplňC 16/20 hr. 250 mm	10.09.2018	22.09.2018	13,00
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	10.09.2018	15.09.2018	6,00
Zvislé a kompletné konštrukcie	17.09.2018	14.10.2018	28,00
Murivo HELUZ 25 P15 brúsených na pero a drážku, (250x375x249)	17.09.2018	25.09.2018	9,00
Priečky HELUZ 14 P10 MVC 2,5 (140x497x238)	17.09.2018	14.10.2018	28,00
Vodorovné konštrukcie	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20.09.2018	21.11.2018	63,00
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	04.10.2018	21.11.2018	49,00
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.	20.09.2018	09.10.2018	20,00
Poter asfaltopieskový podkladový alebo vyrovnávací hr. 1,5mm	20.09.2018	09.10.2018	20,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23.08.2018	25.09.2018	34,00
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm	23.08.2018	28.08.2018	6,00
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,	23.08.2018	28.08.2018	6,00
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	06.09.2018	25.09.2018	20,00
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,	23.08.2018	28.08.2018	6,00


Izolácie proti vode a vlhkosti	**20.09.2018**	**25.09.2018**	**6,00**
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu zvislej	20.09.2018	25.09.2018	6,00
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie	20.09.2018	25.09.2018	6,00
Konštrukcie tesárske	**01.11.2018**	**23.11.2018**	**23,00**
Obloženie stien z dosiek CETRIS na pero a drážku hr. dosky 20 mm	01.11.2018	23.11.2018	23,00
Konštrukcie	**15.11.2018**	**23.11.2018**	**9,00**
Sadrokartónová inštalačná predstena doska 2xRBI 12,5 mm	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Konštrukcie stolárske	**01.11.2018**	**22.11.2018**	**22,00**
Montáž dverového krídla otváravého do zárubne, jednokrídlové	01.11.2018	22.11.2018	22,00
Konštrukcie doplnkové kovové	**15.11.2018**	**23.11.2018**	**9,00**
Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Montáž svetlíkov pultových	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Montáž dverí z AL-profilov	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Podlahy z dlaždíc	**15.11.2018**	**23.11.2018**	**9,00**
Montáž podláh z dlaždíc keramických 400x300 mm	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Podlahy vlysové a parketové	**15.11.2018**	**23.11.2018**	**9,00**
Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Dokončovacie práce a obklady	**25.10.2018**	**23.11.2018**	**30,00**
Montáž obkladov stien z obkladačiek	25.10.2018	23.11.2018	30,00
Dokončovacie práce	**15.11.2018**	**20.11.2018**	**6,00**
Nátery oceľ.konštr. strednýchD syntetické dvojnásobné - 70µm	15.11.2018	20.11.2018	6,00
Dokončovacie práce	**15.11.2018**	**23.11.2018**	**9,00**
Maľby vápenné dvojnásobné	15.11.2018	23.11.2018	9,00
SCK01 - kuchyňa - stavebná časť	**23.08.2018**	**23.11.2018**	**93,00**
Zemné práce	**23.08.2018**	**11.09.2018**	**20,00**
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	23.08.2018	04.09.2018	13,00
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním	30.08.2018	11.09.2018	13,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	06.09.2018	11.09.2018	6,00
Zakladanie	**13.09.2018**	**25.09.2018**	**13,00**
Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s bet výplň hr.30 cm	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Zvislé a kompletné konštrukcie	**20.09.2018**	**16.10.2018**	**27,00**
Murivo HELUZ 30 P15 brúsených (300x247x249)	20.09.2018	09.10.2018	20,00
Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm-atika	20.09.2018	02.10.2018	13,00
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	20.09.2018	09.10.2018	20,00
Priečky zHELUZ 14 P10 na pero a drážku,MVC 2,5 (140x497x238)	27.09.2018	16.10.2018	20,00
Vodorovné konštrukcie	**18.10.2018**	**06.11.2018**	**20,00**
Betón nosníkov a trámov , železový tr.C 20/25	18.10.2018	06.11.2018	20,00
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	18.10.2018	06.11.2018	20,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	**20.09.2018**	**22.11.2018**	**64,00**
Vnútorná omietka stropov , vápennocementová, hr. 8 mm	18.10.2018	13.11.2018	27,00
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	08.11.2018	20.11.2018	13,00
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová,hladená, hr.2 mm	01.11.2018	22.11.2018	22,00
Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS -atika	01.11.2018	13.11.2018	13,00
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm pre sokel (XPS)	25.10.2018	20.11.2018	27,00
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm	01.11.2018	13.11.2018	13,00
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	20.09.2018	09.10.2018	20,00
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu	04.10.2018	16.10.2018	13,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**23.08.2018**	**22.11.2018**	**92,00**
Montáž lešenia ľahkého pracovného	23.08.2018	04.09.2018	13,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného	15.11.2018	22.11.2018	8,00
Izolácie proti vode a vlhkosti	**13.09.2018**	**25.09.2018**	**13,00**
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná	13.09.2018	25.09.2018	13,00
Izolácie striech	**13.09.2018**	**25.09.2018**	**13,00**

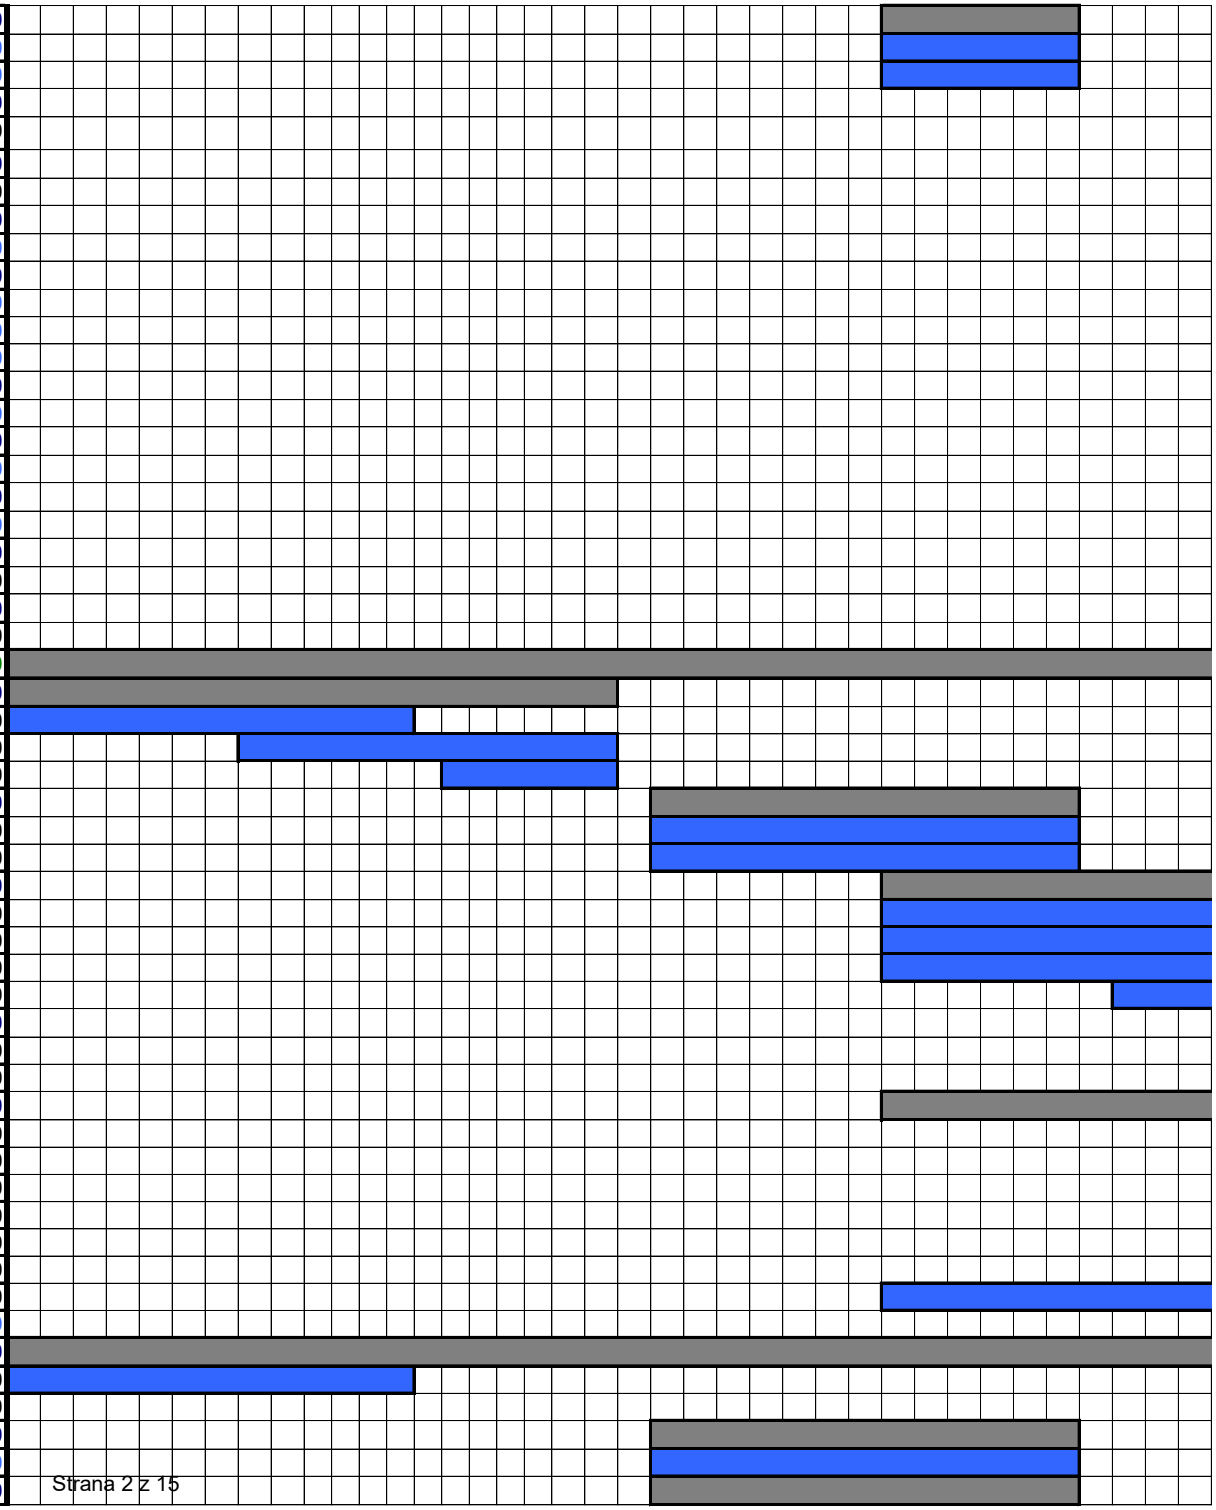


Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	13.09.2018	25.09.2018	13,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ	**04.10.2018**	**16.10.2018**	**13,00**
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne	04.10.2018	16.10.2018	13,00
Konštrukcie tesárske	**06.11.2018**	**23.11.2018**	**18,00**
Obloženie stien z dosiek CETRIS na pero a drážku hr dosky 20 mm	06.11.2018	23.11.2018	18,00
Konštrukcie klampiarske	**25.10.2018**	**23.11.2018**	**30,00**
Oplechovanieo dkvapu z plechov poplastovaných rš. 340 mm	08.11.2018	20.11.2018	13,00
Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaná	15.11.2018	23.11.2018	9,00
Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm,	25.10.2018	13.11.2018	20,00
Konštrukcie stolárske	**08.11.2018**	**20.11.2018**	**13,00**
Montáž plastových okien	08.11.2018	20.11.2018	13,00
Montáž dverového krídla otváravého do zárubne, jednokrídlové	08.11.2018	20.11.2018	13,00
Montáž vzduchotechnických zariadení	**06.11.2018**	**23.11.2018**	**18,00**
Montáž ventilátora malého nástenného na stenu veľkosť: 150	08.11.2018	23.11.2018	16,00
Montáž spiro potrubia DN 125-140	06.11.2018	18.11.2018	13,00
Podlahy z dlaždíc	**25.10.2018**	**06.11.2018**	**13,00**
Montáž podláh z dlaždíc keramických	25.10.2018	06.11.2018	13,00
Dokončovacie práce a obklady	**25.10.2018**	**06.11.2018**	**13,00**
Montáž obkladov stien z obkladačiek	25.10.2018	06.11.2018	13,00
Dokončovacie práce	**01.11.2018**	**22.11.2018**	**22,00**
Maľby vápenné dvojnásobné	01.11.2018	22.11.2018	22,00
IPC01 - vstup pre imobilných do pôvodnej časti	**25.10.2018**	**22.11.2018**	**29,00**
Zakladanie	**25.10.2018**	**30.10.2018**	**6,00**
Betón základových pásov - základy vstupnej rampy vr.zemných prác	25.10.2018	30.10.2018	6,00
Práce a dodávky PSV	**08.11.2018**	**22.11.2018**	**15,00**
Konštrukcie doplnkové kovové	**08.11.2018**	**22.11.2018**	**15,00**
Vstupná rampa pozinkovaná vrátane zábradlia d+ m	08.11.2018	22.11.2018	15,00
ZT01 - zdravotechnika (časť oprávnené)	**30.08.2018**	**18.09.2018**	**20,00**
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	**30.08.2018**	**18.09.2018**	**20,00**
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	30.08.2018	18.09.2018	20,00
VPA01 - vodovodná prípojka areálová	**23.08.2018**	**18.11.2018**	**88,00**
Zemné práce	**23.08.2018**	**04.09.2018**	**13,00**
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	23.08.2018	04.09.2018	13,00
Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov-	30.08.2018	04.09.2018	6,00
Vodorovné konštrukcie	**30.08.2018**	**04.09.2018**	**6,00**
Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	30.08.2018	04.09.2018	6,00
Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia	**04.10.2018**	**18.11.2018**	**46,00**
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80-	06.11.2018	18.11.2018	13,00
Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	04.10.2018	30.10.2018	27,00
Zdravotechnika	**01.11.2018**	**06.11.2018**	**6,00**
Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	01.11.2018	06.11.2018	6,00
KPA01 - kanalizačná prípojka areálová + lapač tukov	**23.08.2018**	**09.10.2018**	**48,00**
Zemné práce	**23.08.2018**	**11.09.2018**	**20,00**
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	23.08.2018	04.09.2018	13,00
Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m3=	30.08.2018	04.09.2018	6,00
Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	06.09.2018	11.09.2018	6,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4	06.09.2018	11.09.2018	6,00
Vodorovné konštrukcie	**28.08.2018**	**09.09.2018**	**13,00**
Lôžko pod potrubie, štrkopdo 63 mm	28.08.2018	09.09.2018	13,00
Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod	**27.09.2018**	**09.10.2018**	**13,00**
Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC	27.09.2018	02.10.2018	6,00
Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	04.10.2018	09.10.2018	6,00
Mimo projekt	**23.08.2018**	**22.01.2019**	**153,00**
TIFS01 tepelná izolácia fasády a strechy výplne otvorov vo fasáde	**23.08.2018**	**22.01.2019**	**153,00**

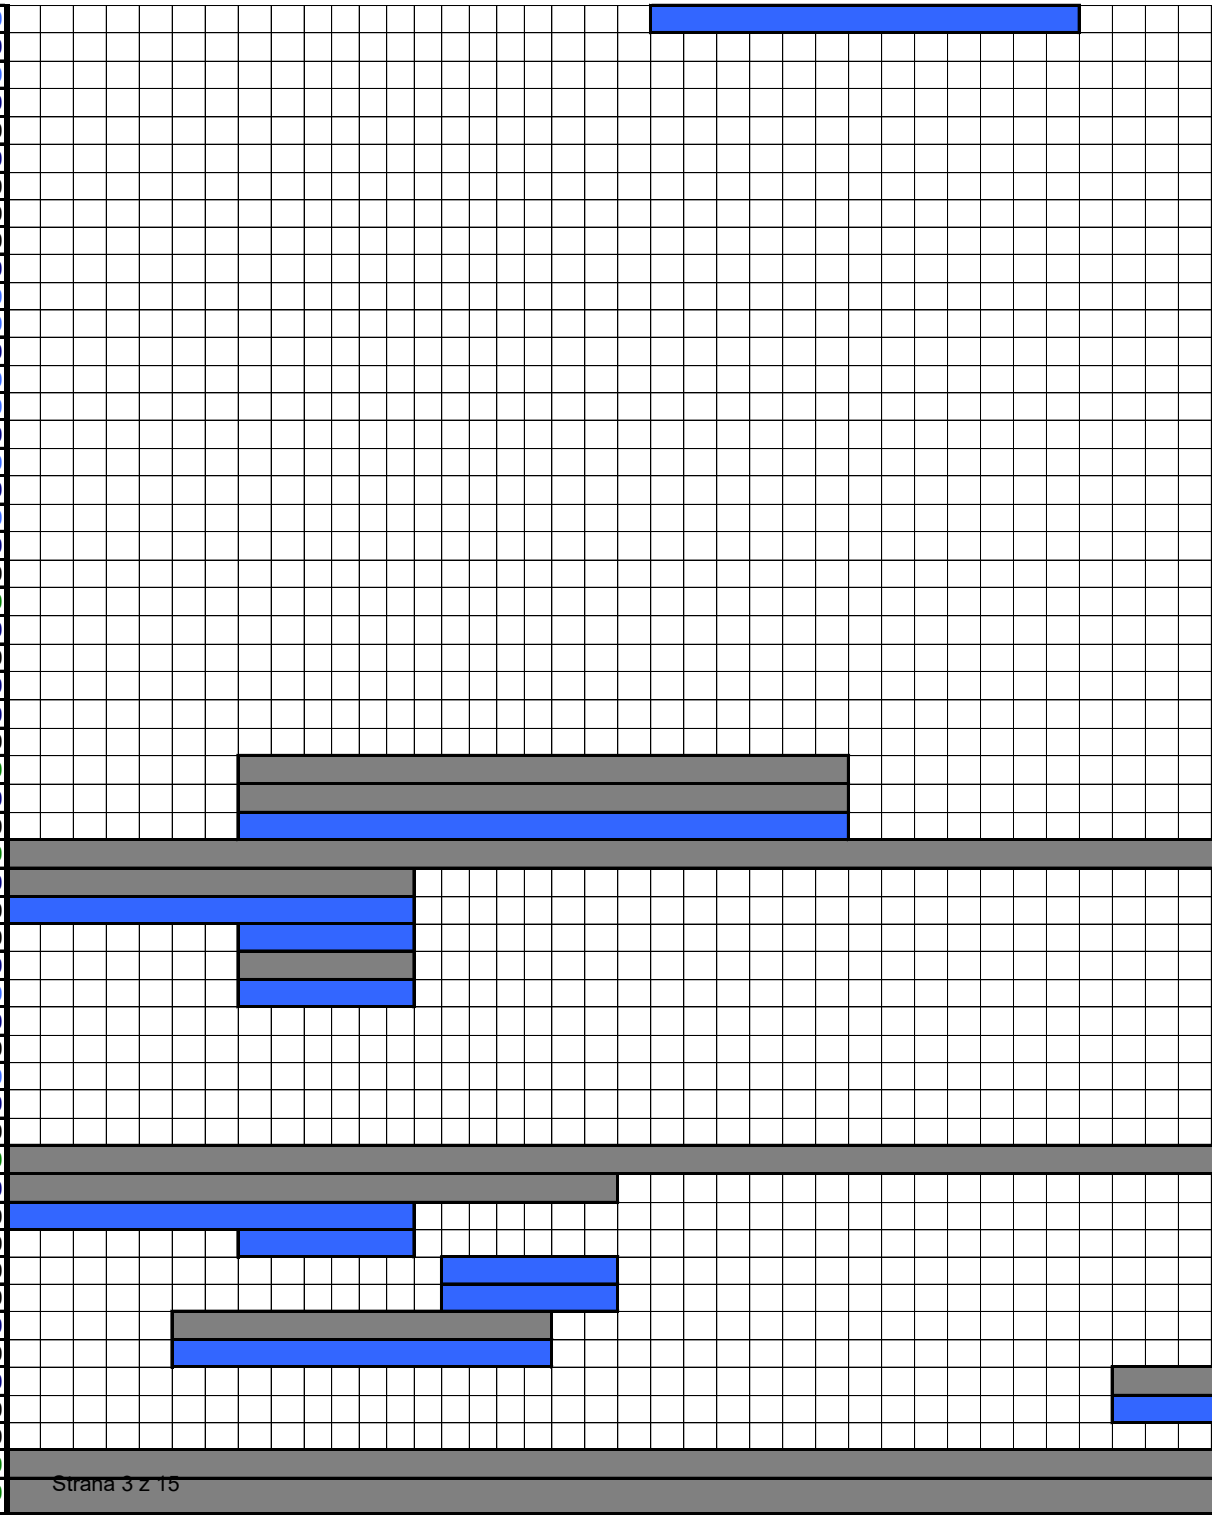


Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	**18.10.2018**	**22.01.2019**	**97,00**
Začistenie omietok okolo okien,	22.11.2018	22.01.2019	62,00
Farbenie vonkajšej omietky stien, pilierov do troch farieb	06.12.2018	22.01.2019	48,00
Vonkajšia omietka stien , silikónová, Silikonharzputz, hladená, hr. 2	15.11.2018	22.01.2019	69,00
Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS -atika	15.11.2018	22.01.2019	69,00
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm sokel (XPS), kotvy vr. líšt, lemovaní	15.11.2018	22.01.2019	69,00
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. líšt, lemovaní	25.10.2018	22.01.2019	90,00
Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm doskami FKD	18.10.2018	22.01.2019	97,00
Izolácie striech	**27.09.2018**	**08.01.2019**	**104,00**
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	27.09.2018	08.01.2019	104,00
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike	11.10.2018	01.01.2019	83,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ	**25.10.2018**	**18.12.2018**	**55,00**
Izolácie tepelné, doplnky - difúzna fólia	25.10.2018	18.12.2018	55,00
Konštrukcie klampiarske	**23.08.2018**	**22.01.2019**	**153,00**
Lemovanie múru rš.900 mm plech poplastovaný	22.11.2018	22.01.2019	62,00
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm,	23.08.2018	11.09.2018	20,00
Oplechovanie parapetov hliníkové biele hr. 1,8 mm, š. 250 mm	11.10.2018	27.11.2018	48,00
Oplechovanie múrov, z plechov poplastovaných rš. 440 mm	01.11.2018	18.12.2018	48,00
Konštrukcie stolárske	**04.10.2018**	**27.11.2018**	**55,00**
Montáž plastových okien	04.10.2018	27.11.2018	55,00
SCJ01 - jedáleň - stavebná časť	**23.08.2018**	**22.01.2019**	**153,00**
Zemné práce	**30.08.2018**	**09.10.2018**	**41,00**
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	30.08.2018	02.10.2018	34,00
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu	27.09.2018	09.10.2018	13,00
Zakladanie	**20.09.2018**	**23.10.2018**	**34,00**
Murivo zák pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	04.10.2018	23.10.2018	20,00
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	20.09.2018	16.10.2018	27,00
Zvislé a kompletné konštrukcie	**27.09.2018**	**13.11.2018**	**48,00**
Murivo HELUZ 30 P 15 brúsených , na lepidlo (300x247x249)	04.10.2018	30.10.2018	27,00
Murivo (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	27.09.2018	16.10.2018	20,00
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	18.10.2018	06.11.2018	20,00
Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P10 MVC 2,5 (140x497x238)	11.10.2018	13.11.2018	34,00
Vodorovné konštrukcie	**08.11.2018**	**27.11.2018**	**20,00**
Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 7000 mm a vložiek ST25	08.11.2018	27.11.2018	20,00
Betón nosníkov a trámov , železový tr.C 20/25	08.11.2018	20.11.2018	13,00
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	08.11.2018	27.11.2018	20,00
Komunikácie	**03.01.2019**	**22.01.2019**	**20,00**
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. 250 mm	03.01.2019	22.01.2019	20,00
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	03.01.2019	22.01.2019	20,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	**18.10.2018**	**22.01.2019**	**97,00**
Vnútorná omietka stropov , vápennocementová, hr. 8 mm	29.11.2018	04.12.2018	6,00
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	29.11.2018	11.12.2018	13,00
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, hr. 2 mm	03.01.2019	22.01.2019	20,00
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	25.10.2018	13.11.2018	20,00
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu,	18.10.2018	23.10.2018	6,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**23.08.2018**	**22.01.2019**	**153,00**
Osadenie záhonového alebo parkového	03.01.2019	22.01.2019	20,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného	23.08.2018	04.09.2018	13,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného	17.01.2019	22.01.2019	6,00
Izolácie proti vode a vlhkosti	**06.09.2018**	**11.09.2018**	**6,00**
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti	06.09.2018	11.09.2018	6,00
Izolácie striech	**06.09.2018**	**08.01.2019**	**125,00**
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy	06.09.2018	18.09.2018	13,00
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek	29.11.2018	08.01.2019	41,00

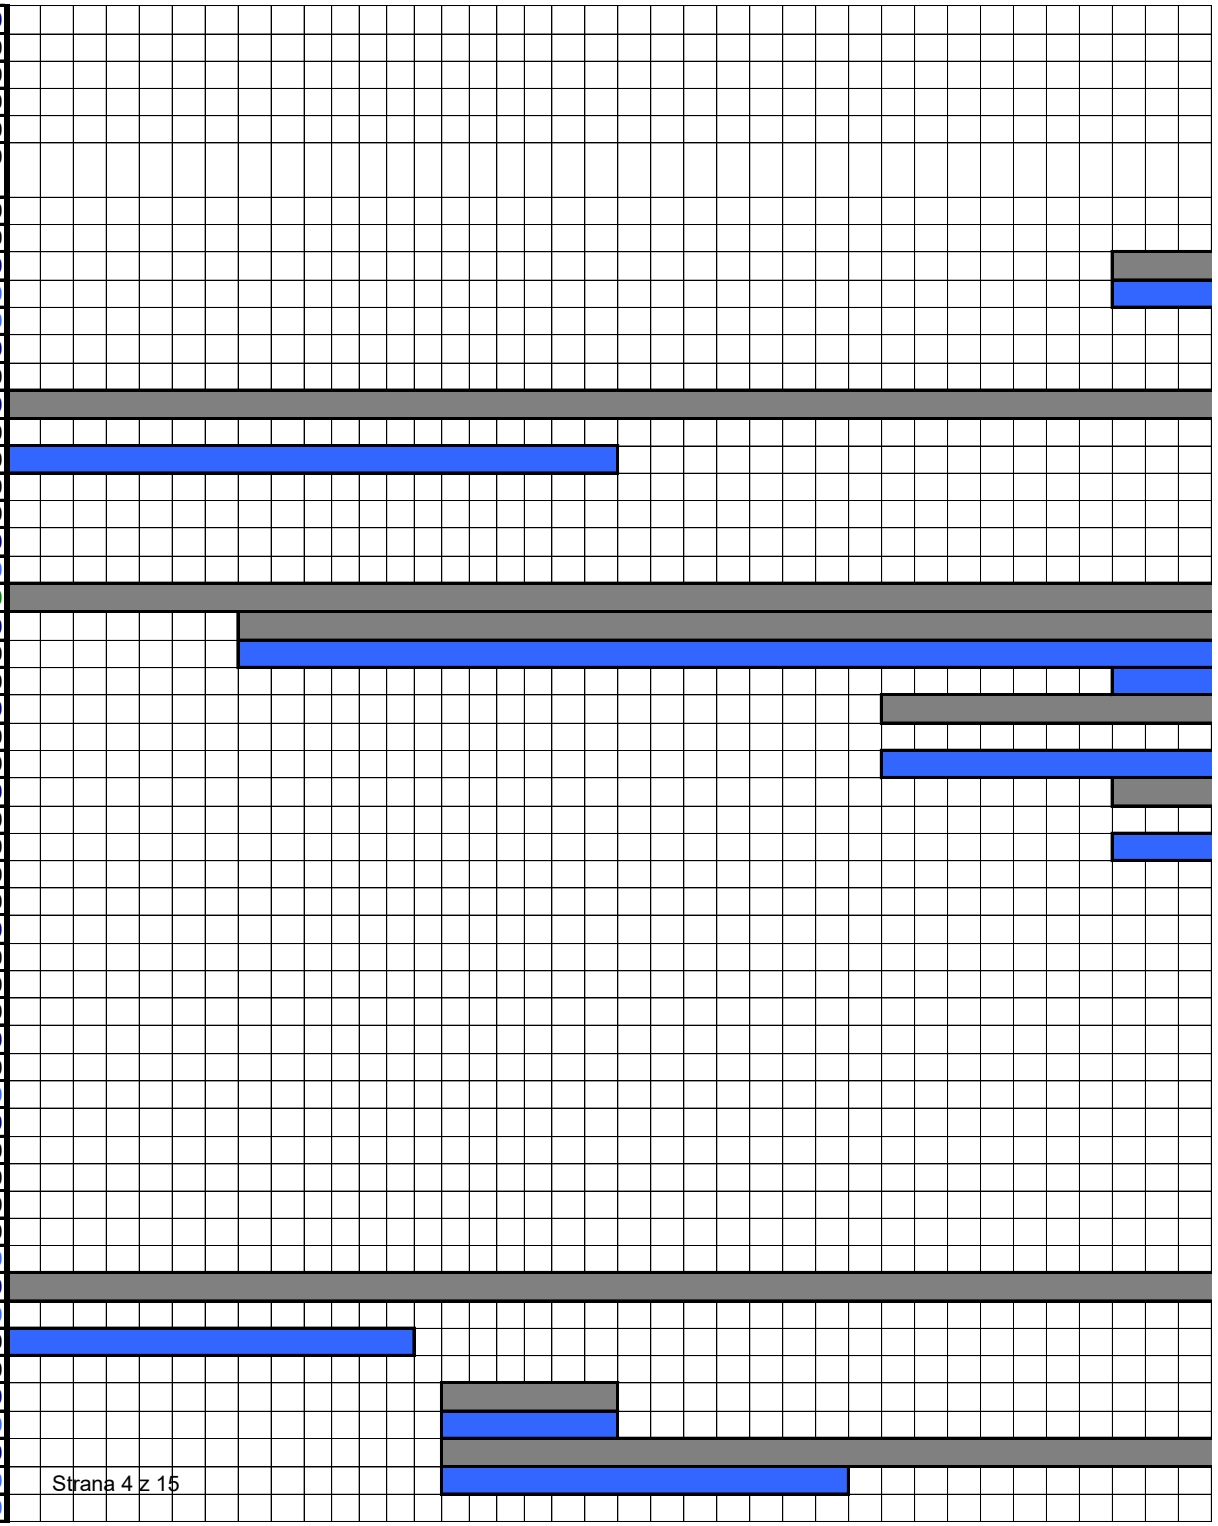



IZOLÁCIE TEPELNÉ	**22.11.2018**	**22.01.2019**	**62,00**
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne	13.12.2018	08.01.2019	27,00
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou,	22.11.2018	22.01.2019	62,00
Konštrukcie tesárske	**20.12.2018**	**22.01.2019**	**34,00**
Obloženie stien z dosiek CETRIS na pero a drážkuhr. dosky 20 mm	20.12.2018	22.01.2019	34,00
Konštrukcie	**08.11.2018**	**20.11.2018**	**13,00**
Sadrokartónová inštalačná predstena	08.11.2018	20.11.2018	13,00
Konštrukcie klampiarske	**27.12.2018**	**22.01.2019**	**27,00**
Oplechovanieo dkvapu z plechov poplastovaných rš. 340 mm	27.12.2018	22.01.2019	27,00
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek	27.12.2018	22.01.2019	27,00
Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaná	17.01.2019	22.01.2019	6,00
Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, čela, hákov,	27.12.2018	22.01.2019	27,00
Konštrukcie stolárske	**15.11.2018**	**22.01.2019**	**69,00**
Montáž plastových okien	15.11.2018	04.12.2018	20,00
Montáž dverového krídla otváravého do zárubne, jednokrídlové	03.01.2019	22.01.2019	20,00
Konštrukcie doplnkové kovové	**13.12.2018**	**08.01.2019**	**27,00**
Montáž dverí z AL-profilov	13.12.2018	08.01.2019	27,00
Podlahy z dlaždíc	**13.12.2018**	**15.01.2019**	**34,00**
Montáž podláh z dlaždíc keramických	13.12.2018	15.01.2019	34,00
Dokončovacie práce a obklady	**13.12.2018**	**15.01.2019**	**34,00**
Montáž obkladov stien z obkladačiek	13.12.2018	15.01.2019	34,00
Dokončovacie práce	**03.01.2019**	**22.01.2019**	**20,00**
Maľby vápenné dvojnásobné	03.01.2019	22.01.2019	20,00
IMJ01 - vstup pre imobilných do jedálne	**27.12.2018**	**22.01.2019**	**27,00**
Zakladanie	**27.12.2018**	**01.01.2019**	**6,00**
Betón základových pásov - základy vstupnej rampy vr.zemných prác	27.12.2018	01.01.2019	6,00
Konštrukcie doplnkové kovové	**10.01.2019**	**22.01.2019**	**13,00**
Vstupná rampa pozinkovaná vrátane zábradlia d+ m	10.01.2019	22.01.2019	13,00
UK01 - vykurovanie	**18.10.2018**	**22.01.2019**	**97,00**
Izolácie tepelné	**18.10.2018**	**27.11.2018**	**41,00**
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 42-73	18.10.2018	27.11.2018	41,00
Ústredné kúrenie, kotolne	**21.01.2019**	**22.01.2019**	**2,00**
Zakurovacia skúška	21.01.2019	22.01.2019	2,00
Ústredné kúrenie, strojovne	**03.01.2019**	**15.01.2019**	**13,00**
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	03.01.2019	15.01.2019	13,00
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	**01.11.2018**	**18.12.2018**	**48,00**
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	01.11.2018	27.11.2018	27,00
Potrubie plastové, spoj zvarovaný D 50 mm, PN 20	08.11.2018	04.12.2018	27,00
Tlaková skúška potrubia do priem. 89/5	13.12.2018	18.12.2018	6,00
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	**10.01.2019**	**22.01.2019**	**13,00**
Montáž vykurovacieho telesa trojradového s odvzdušnením	10.01.2019	22.01.2019	13,00
Dokončovacie práce	**13.12.2018**	**22.01.2019**	**41,00**
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie farby bielej	13.12.2018	22.01.2019	41,00
EI01 - elektroinštalácia	**03.01.2019**	**22.01.2019**	**20,00**
Elektromontáže	**03.01.2019**	**22.01.2019**	**20,00**
Odborná prehliadka a odborná skúška elektro	08.01.2019	20.01.2019	13,00
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia	03.01.2019	15.01.2019	13,00
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V	03.01.2019	22.01.2019	20,00
G Svietidlo interierové okruhlé stropné	03.01.2019	22.01.2019	20,00
BZ01 - bleskozvod	**27.12.2018**	**22.01.2019**	**27,00**
Elektromontáže	**27.12.2018**	**22.01.2019**	**27,00**
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	27.12.2018	22.01.2019	27,00
Uzemňovacia tyč FeZn ZT	27.12.2018	22.01.2019	27,00
Revízna správa, odborná skúška bleskozvodu	21.01.2019	22.01.2019	2,00

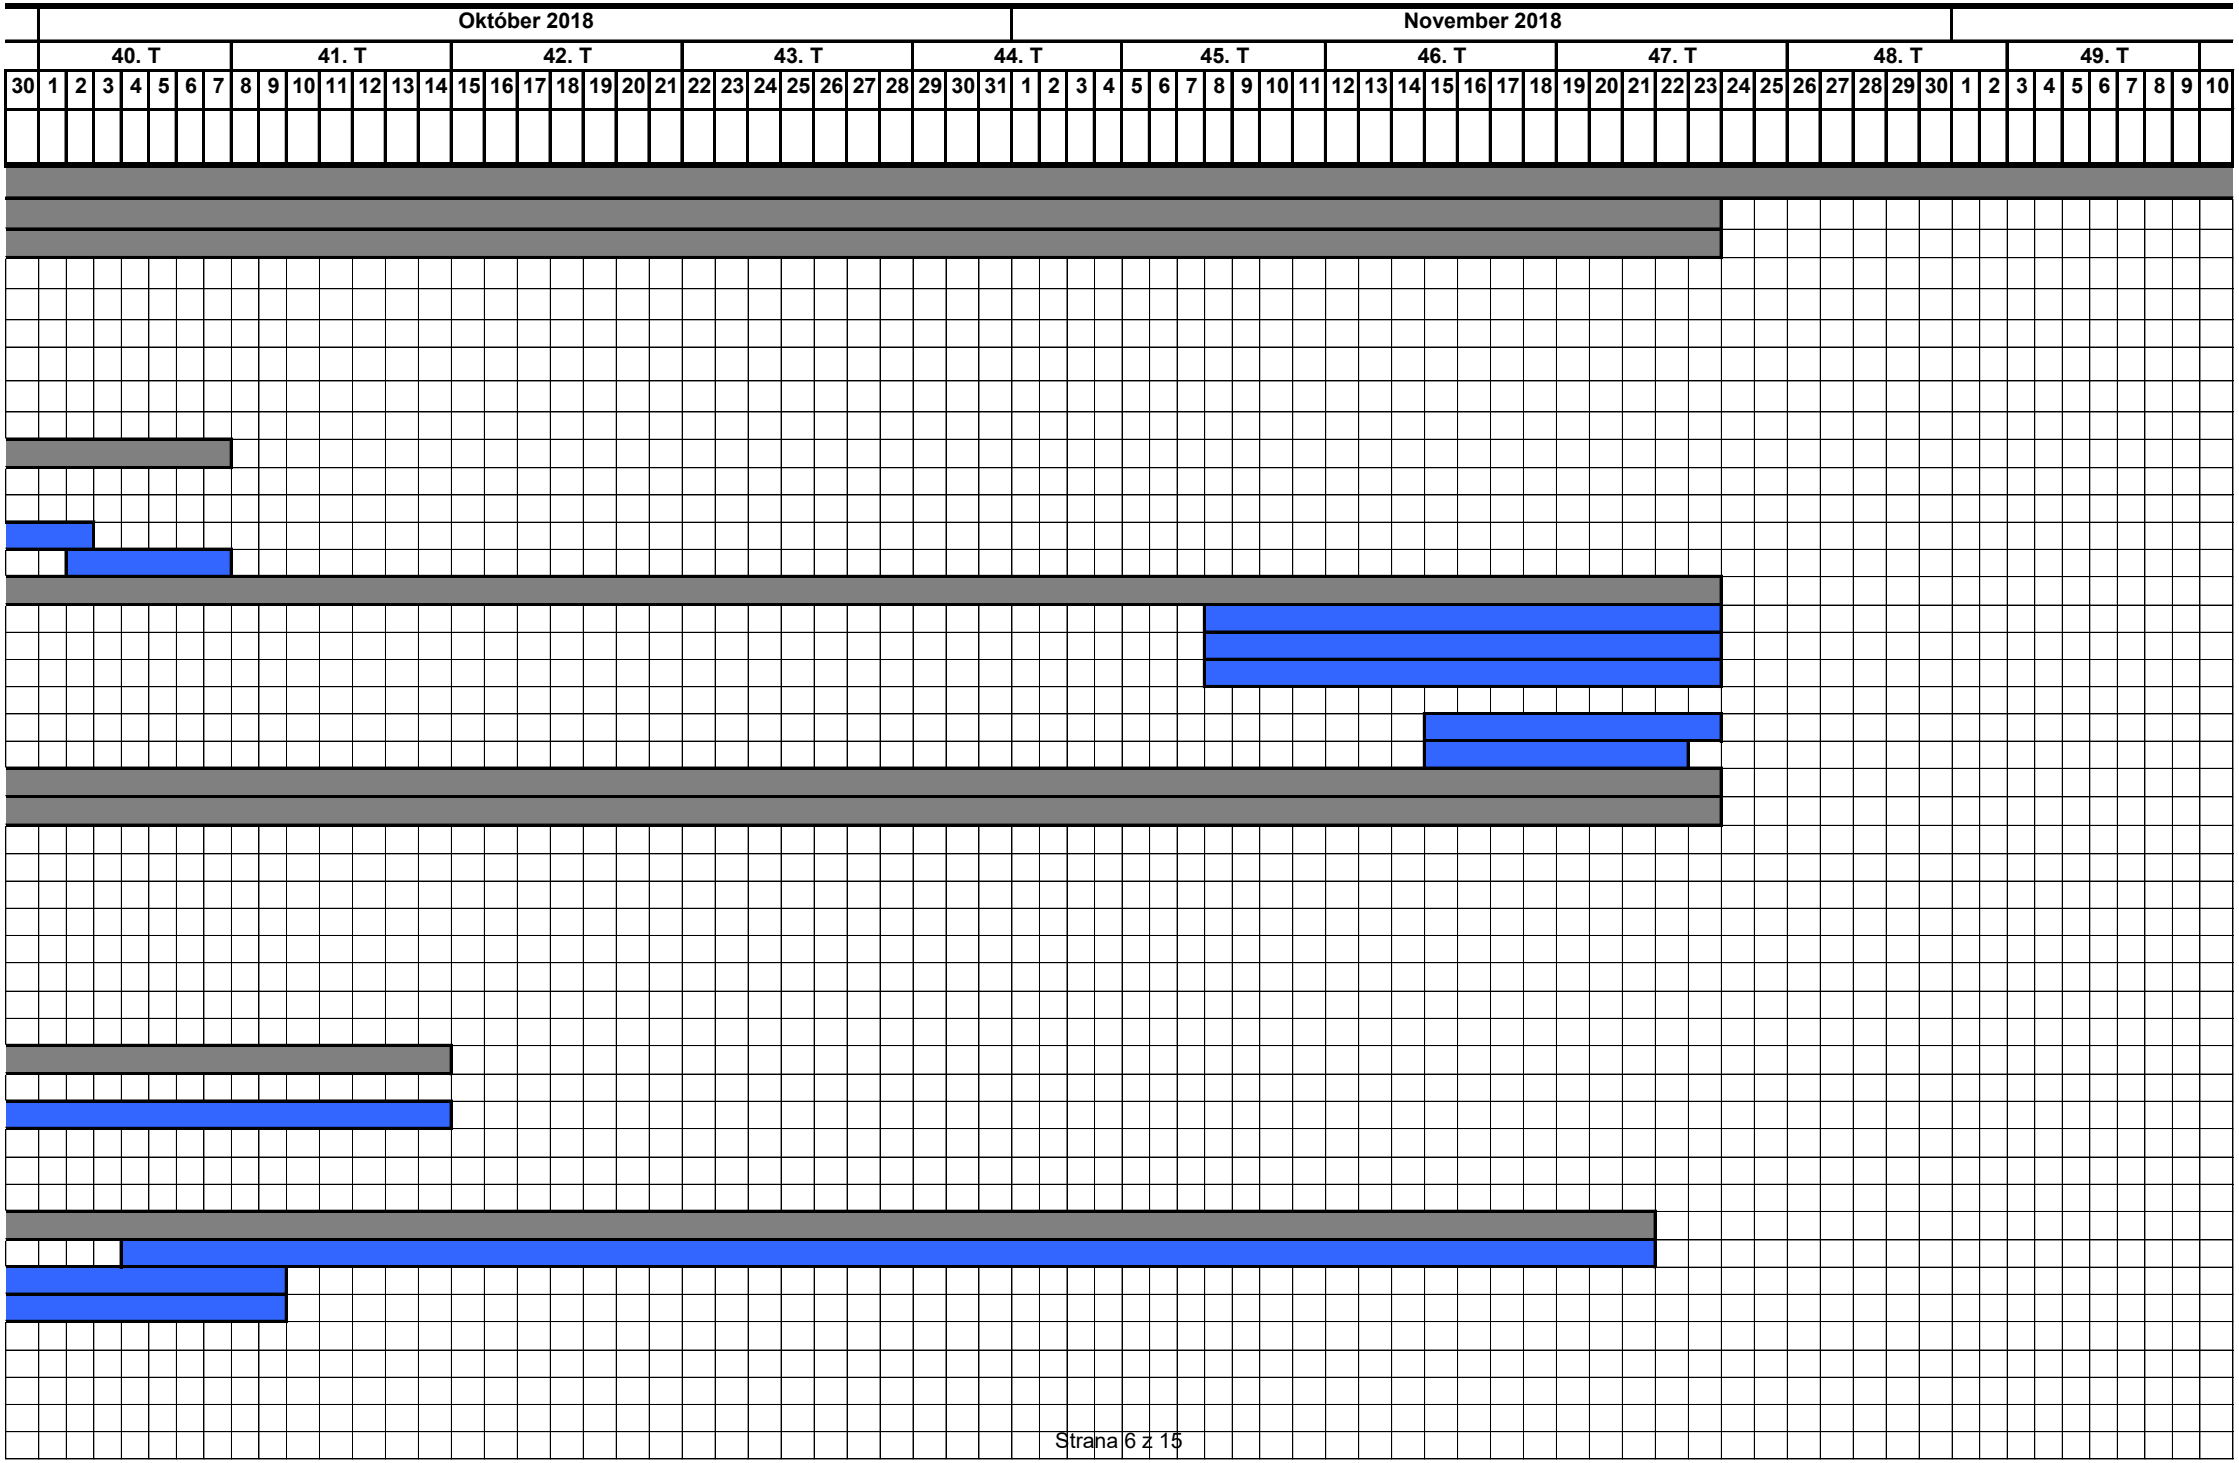
Október 2018
November 2018
40. T
41. T
42. T
43. T
44. T
45. T
46. T
47. T
48. T
49. T
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

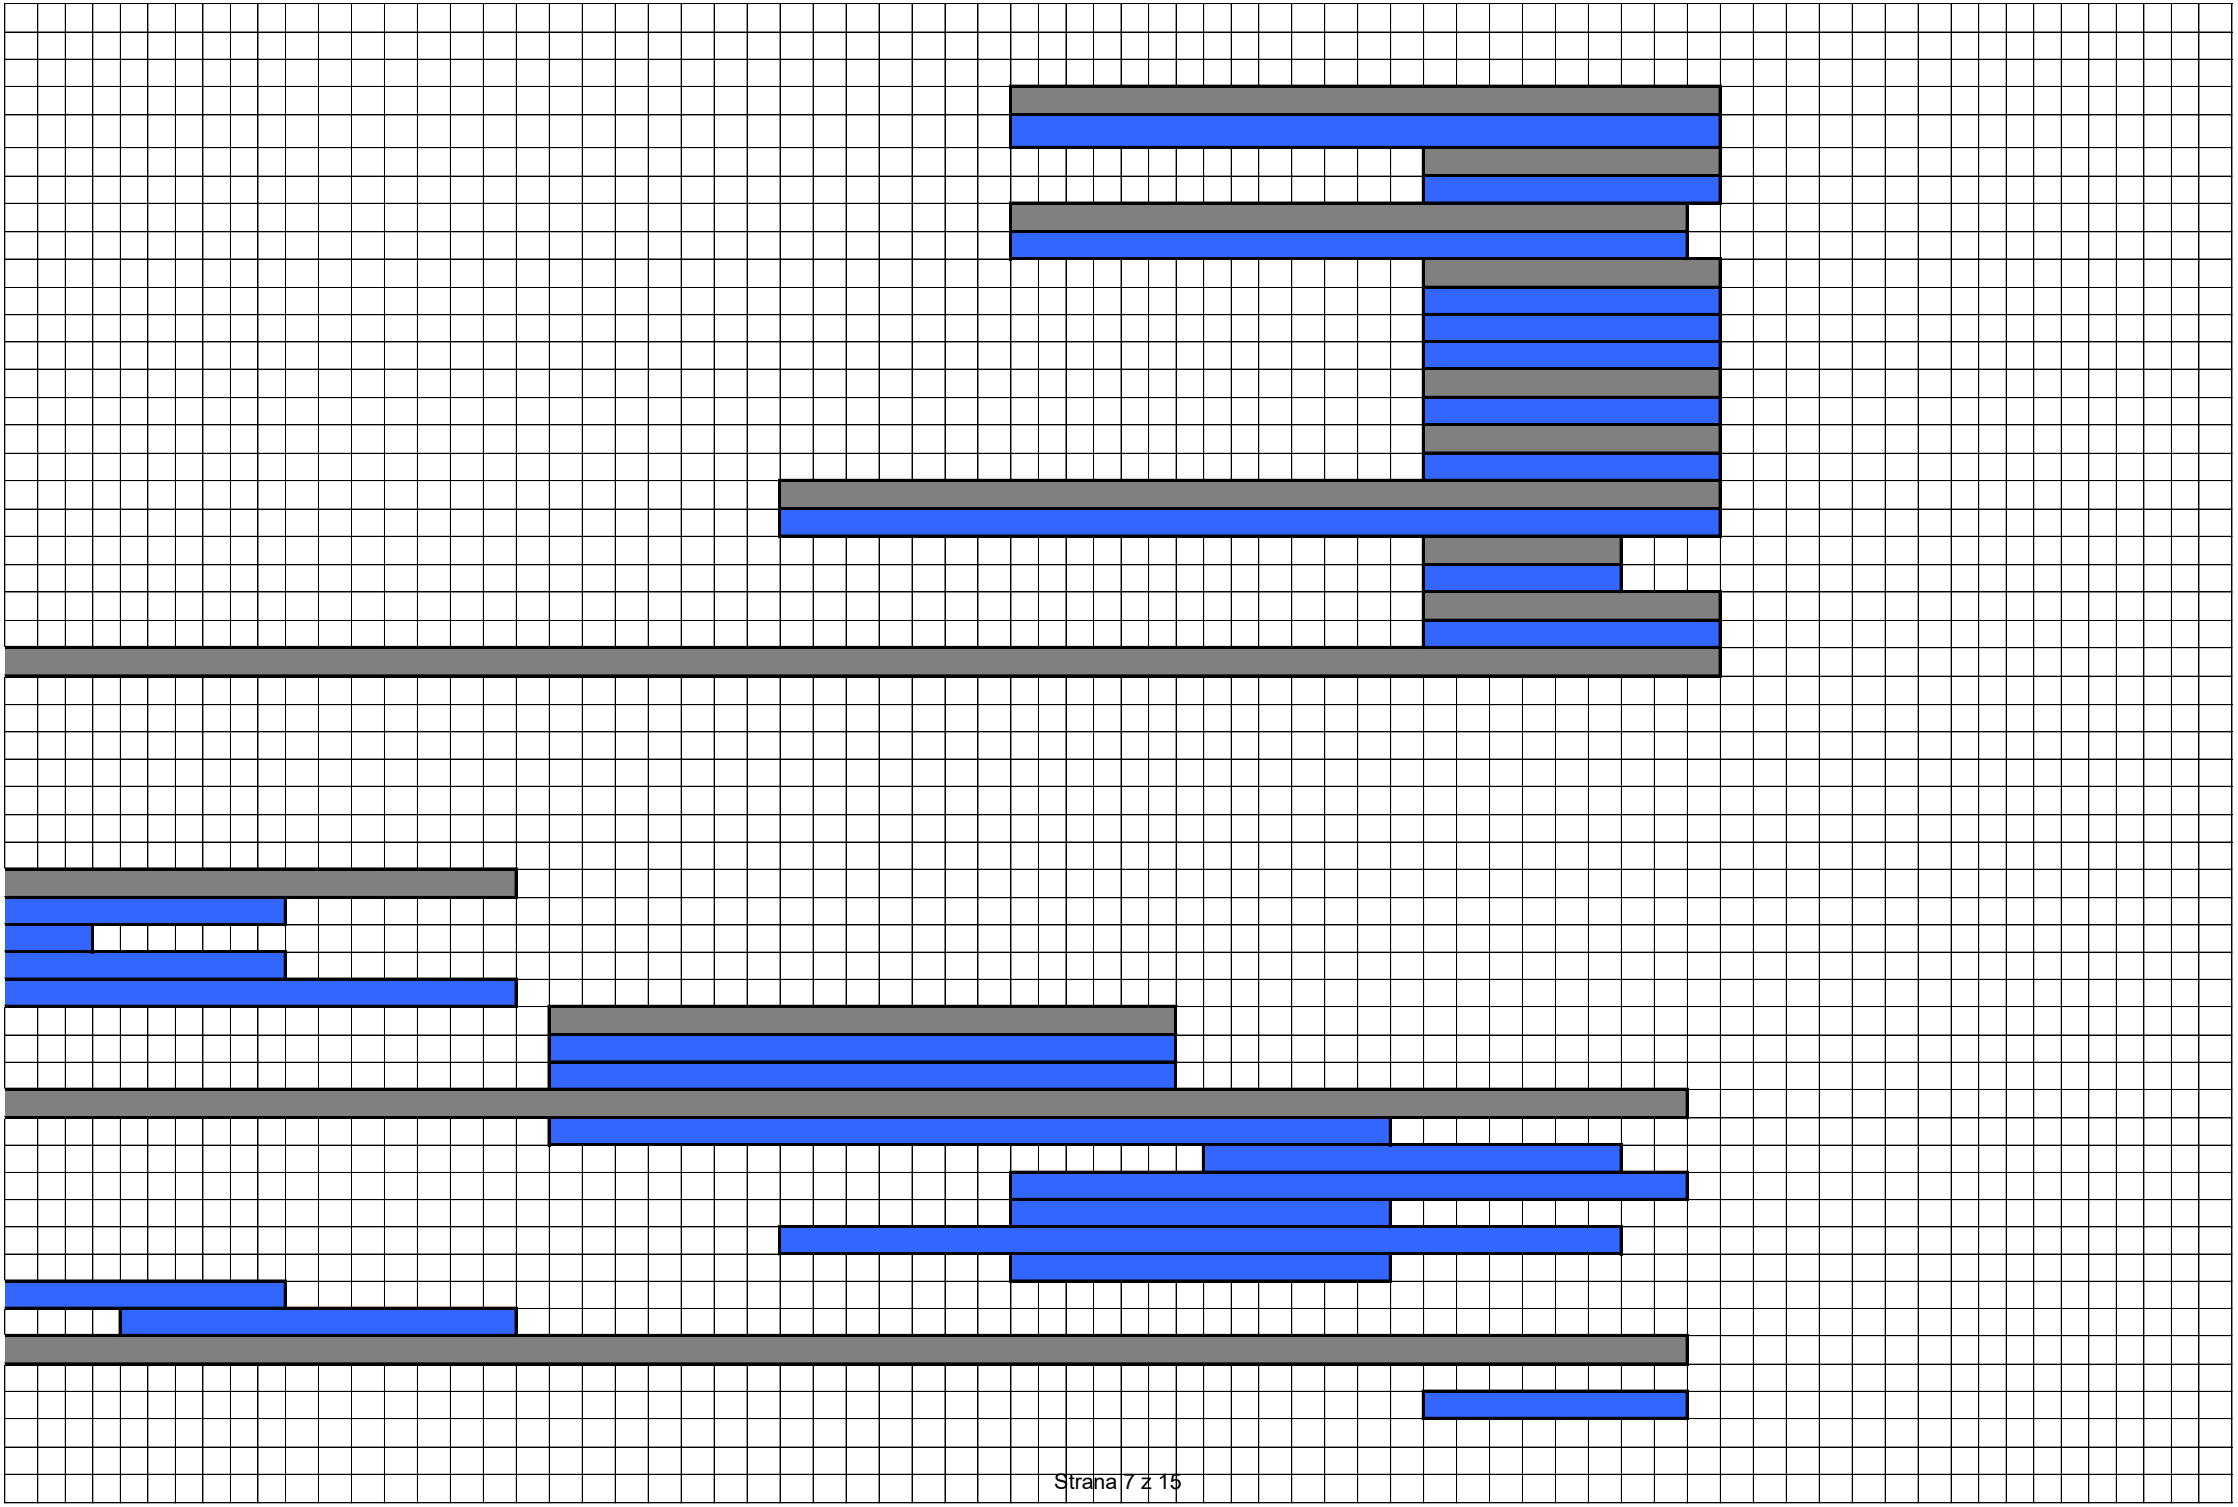



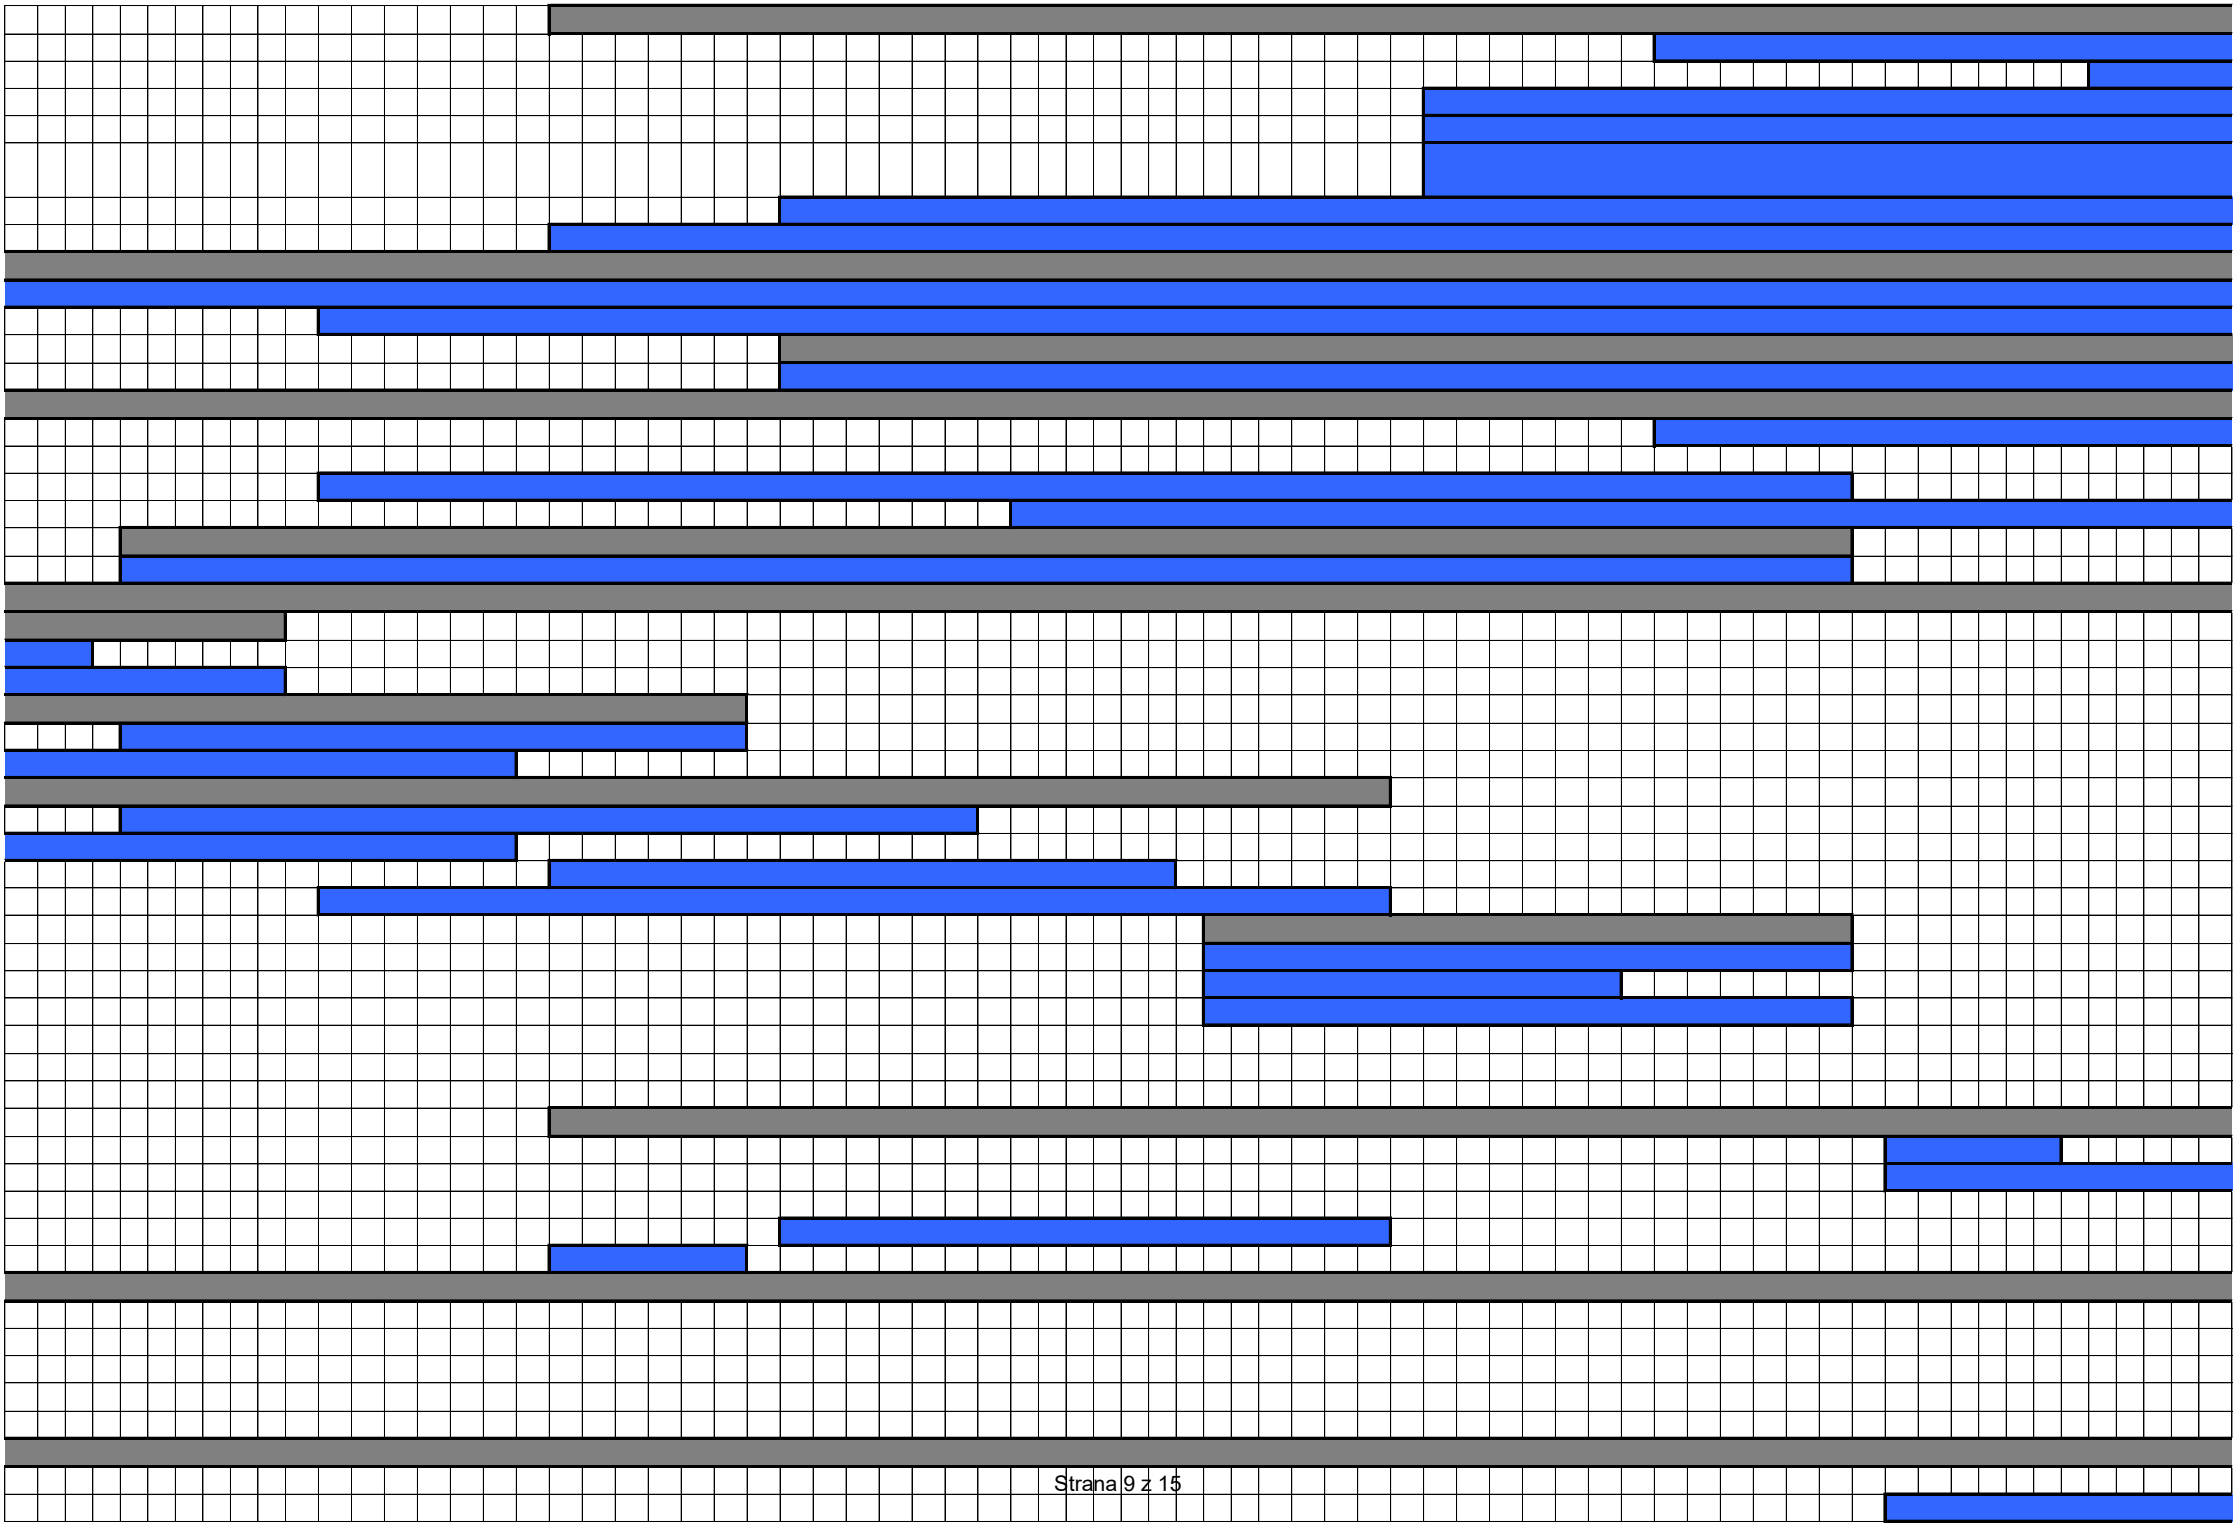

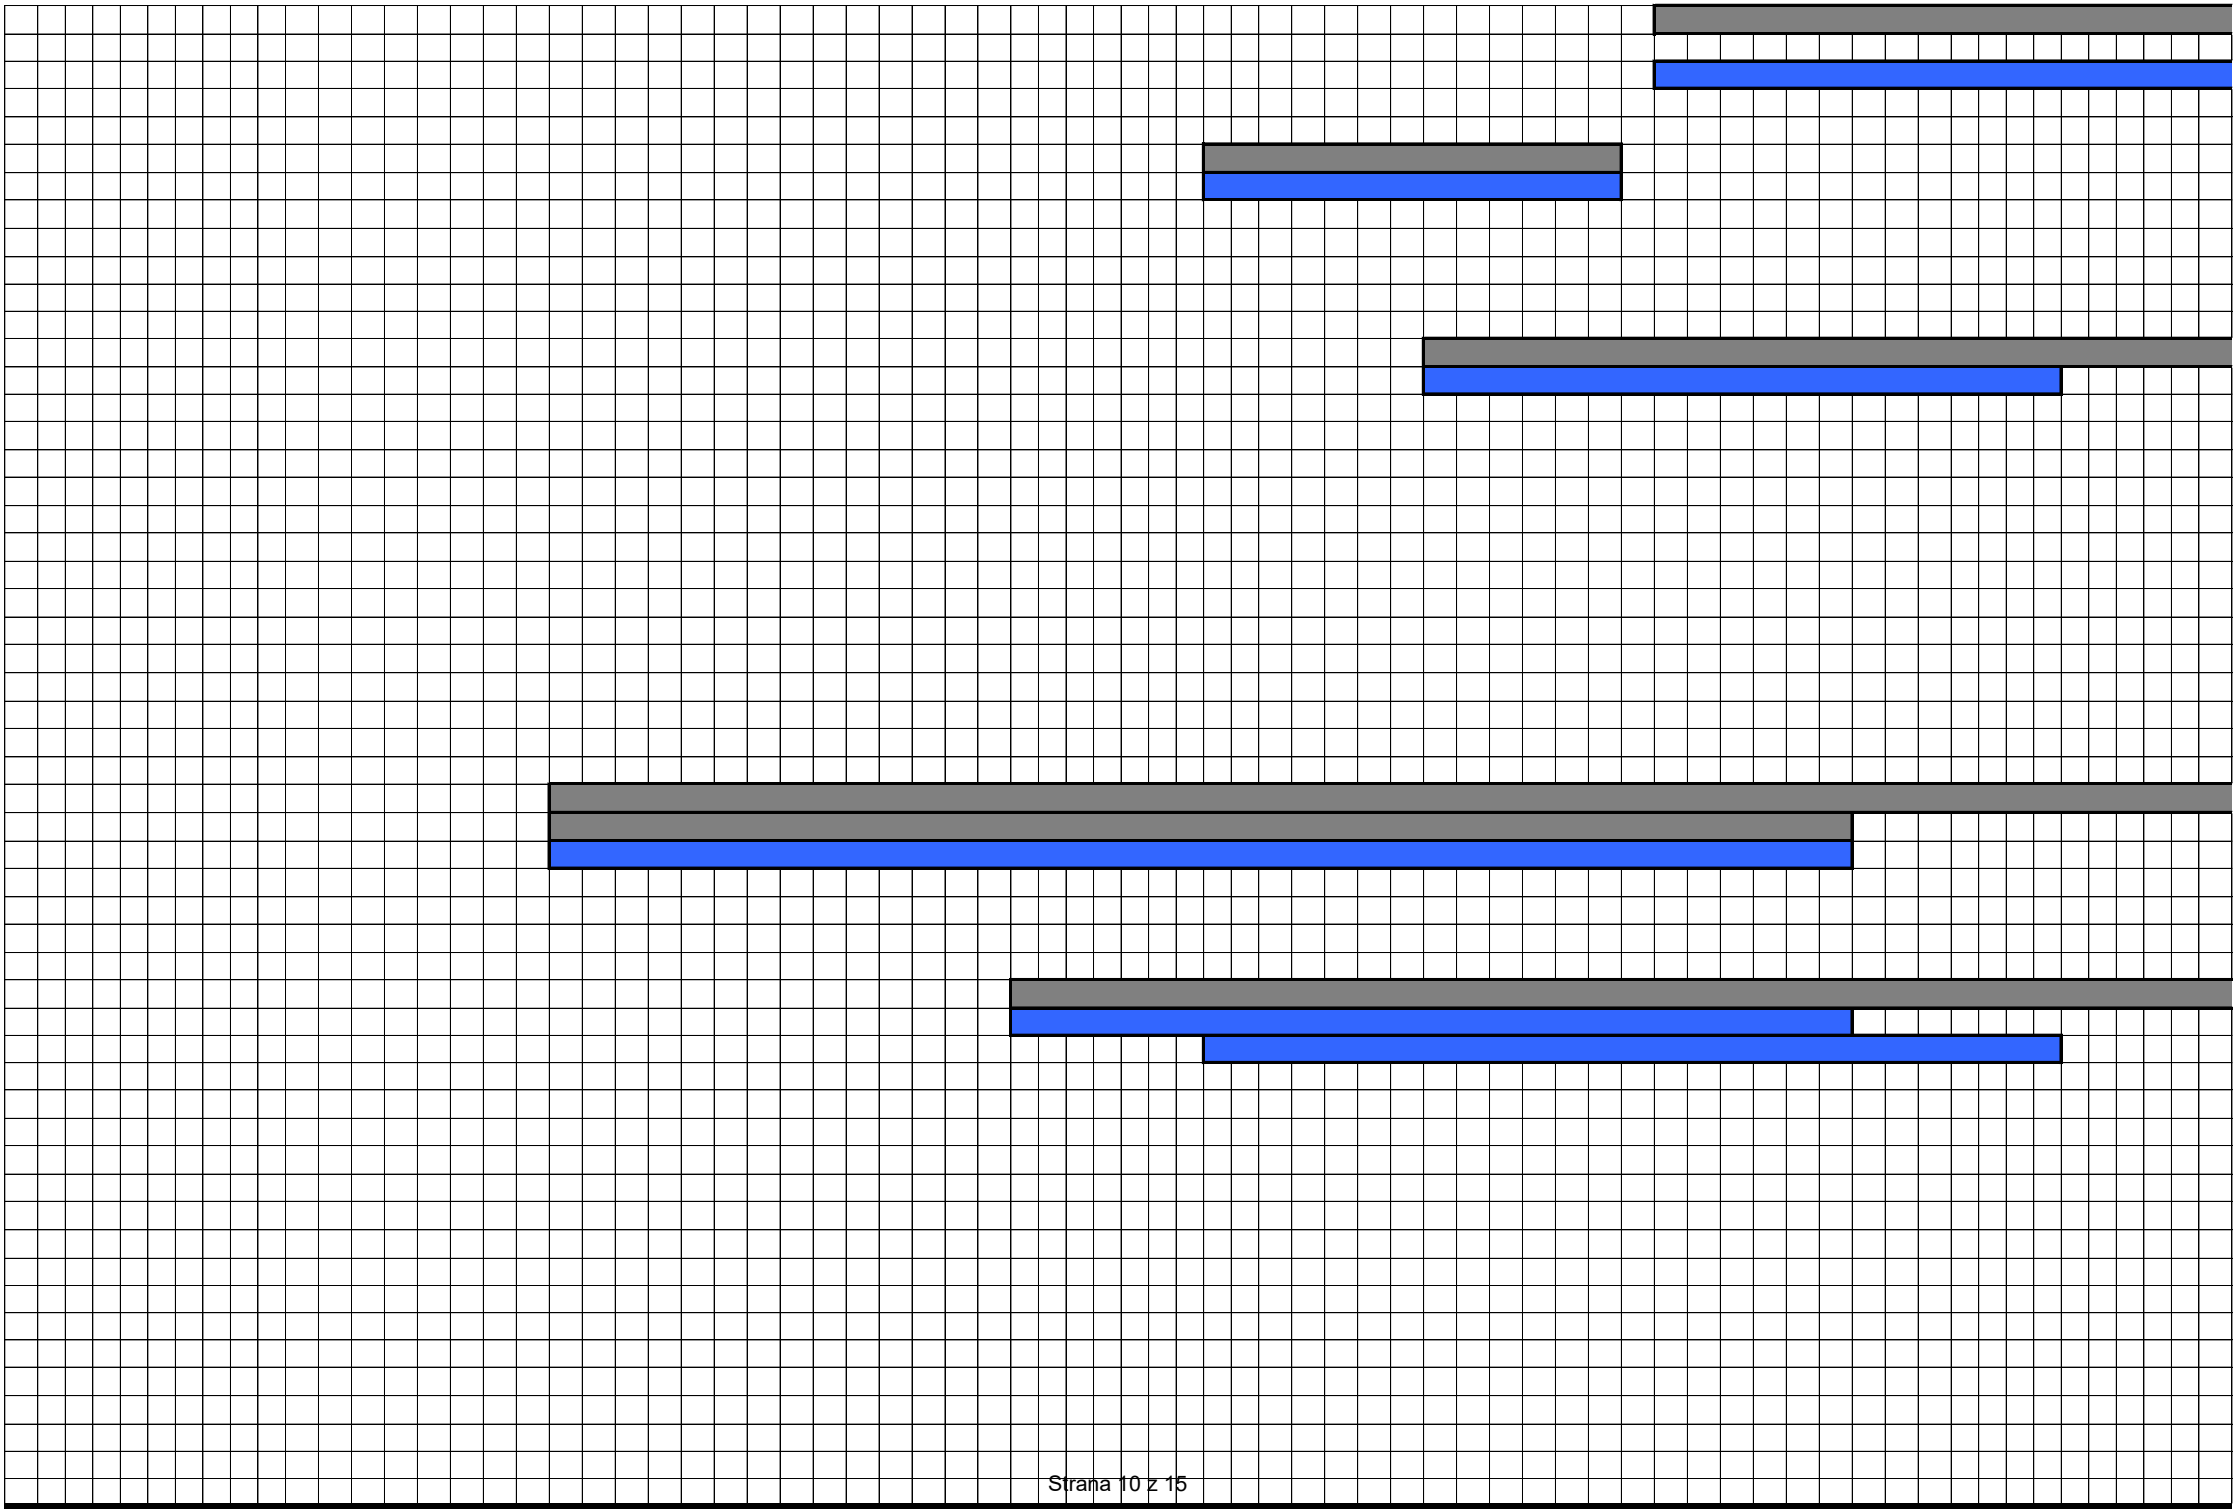

| December 2018 | | |

